

COMUNE di POMARANCE

Provincia di Pisa


Cronoprogramma di PROGETTO


OGGETTO: Interventi di rifacimento tratto di acquedotto in località "Gallerone" a Pomarance

COMMITTENTE: Comune di Pomarance

Pomarance, 18/07/2019

Il Tecnico
(Geom. Edoardo Bassanello)

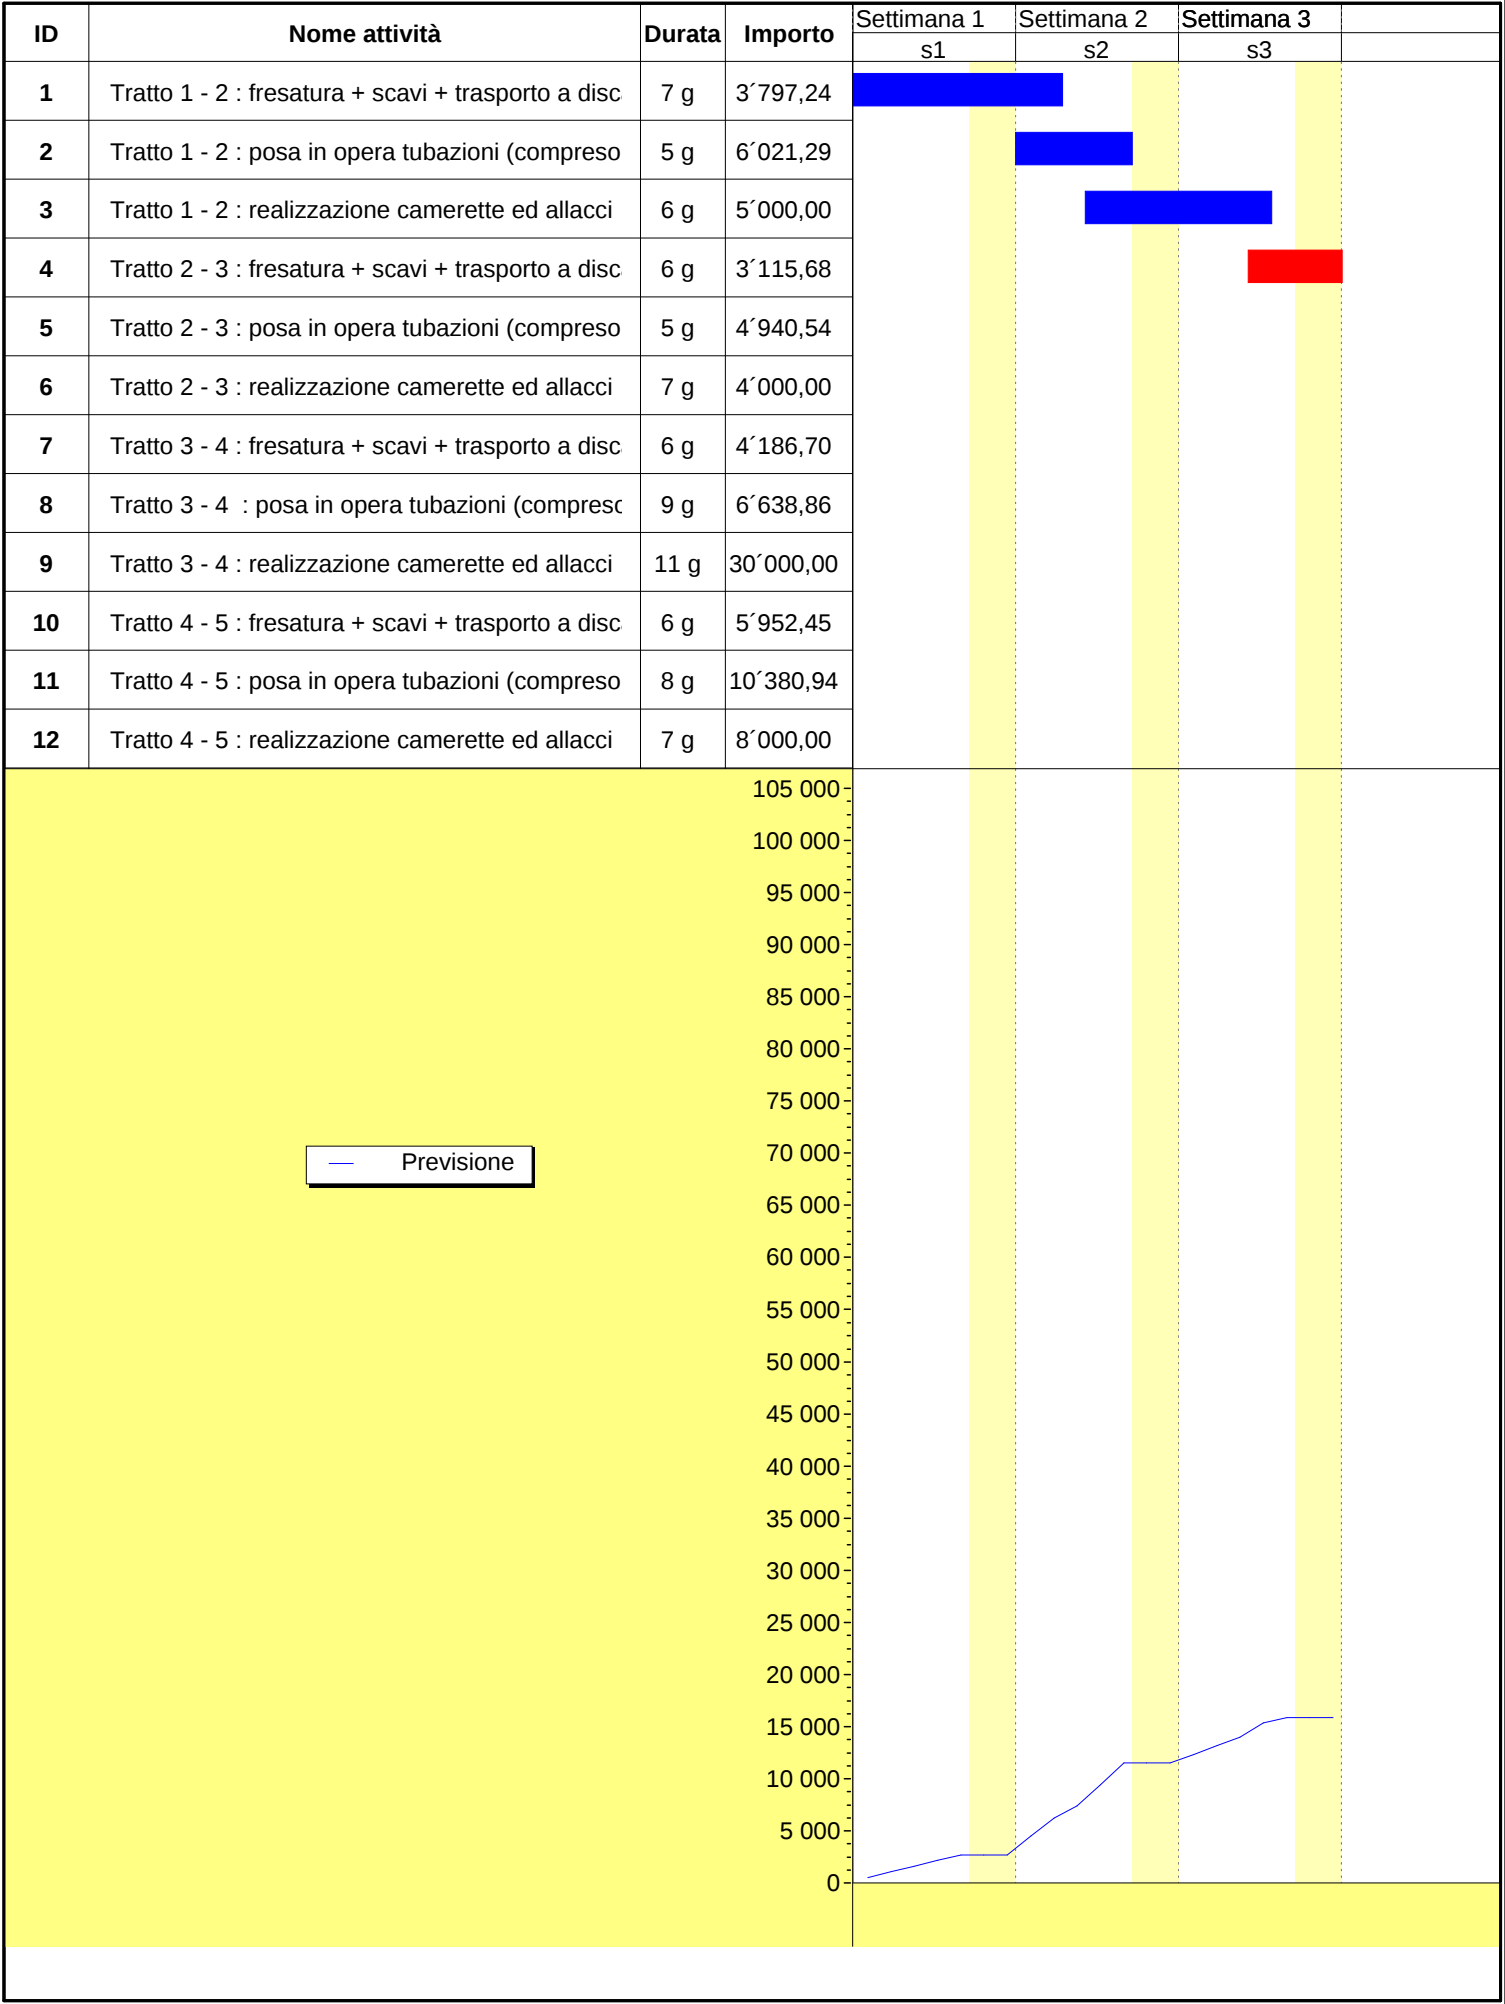

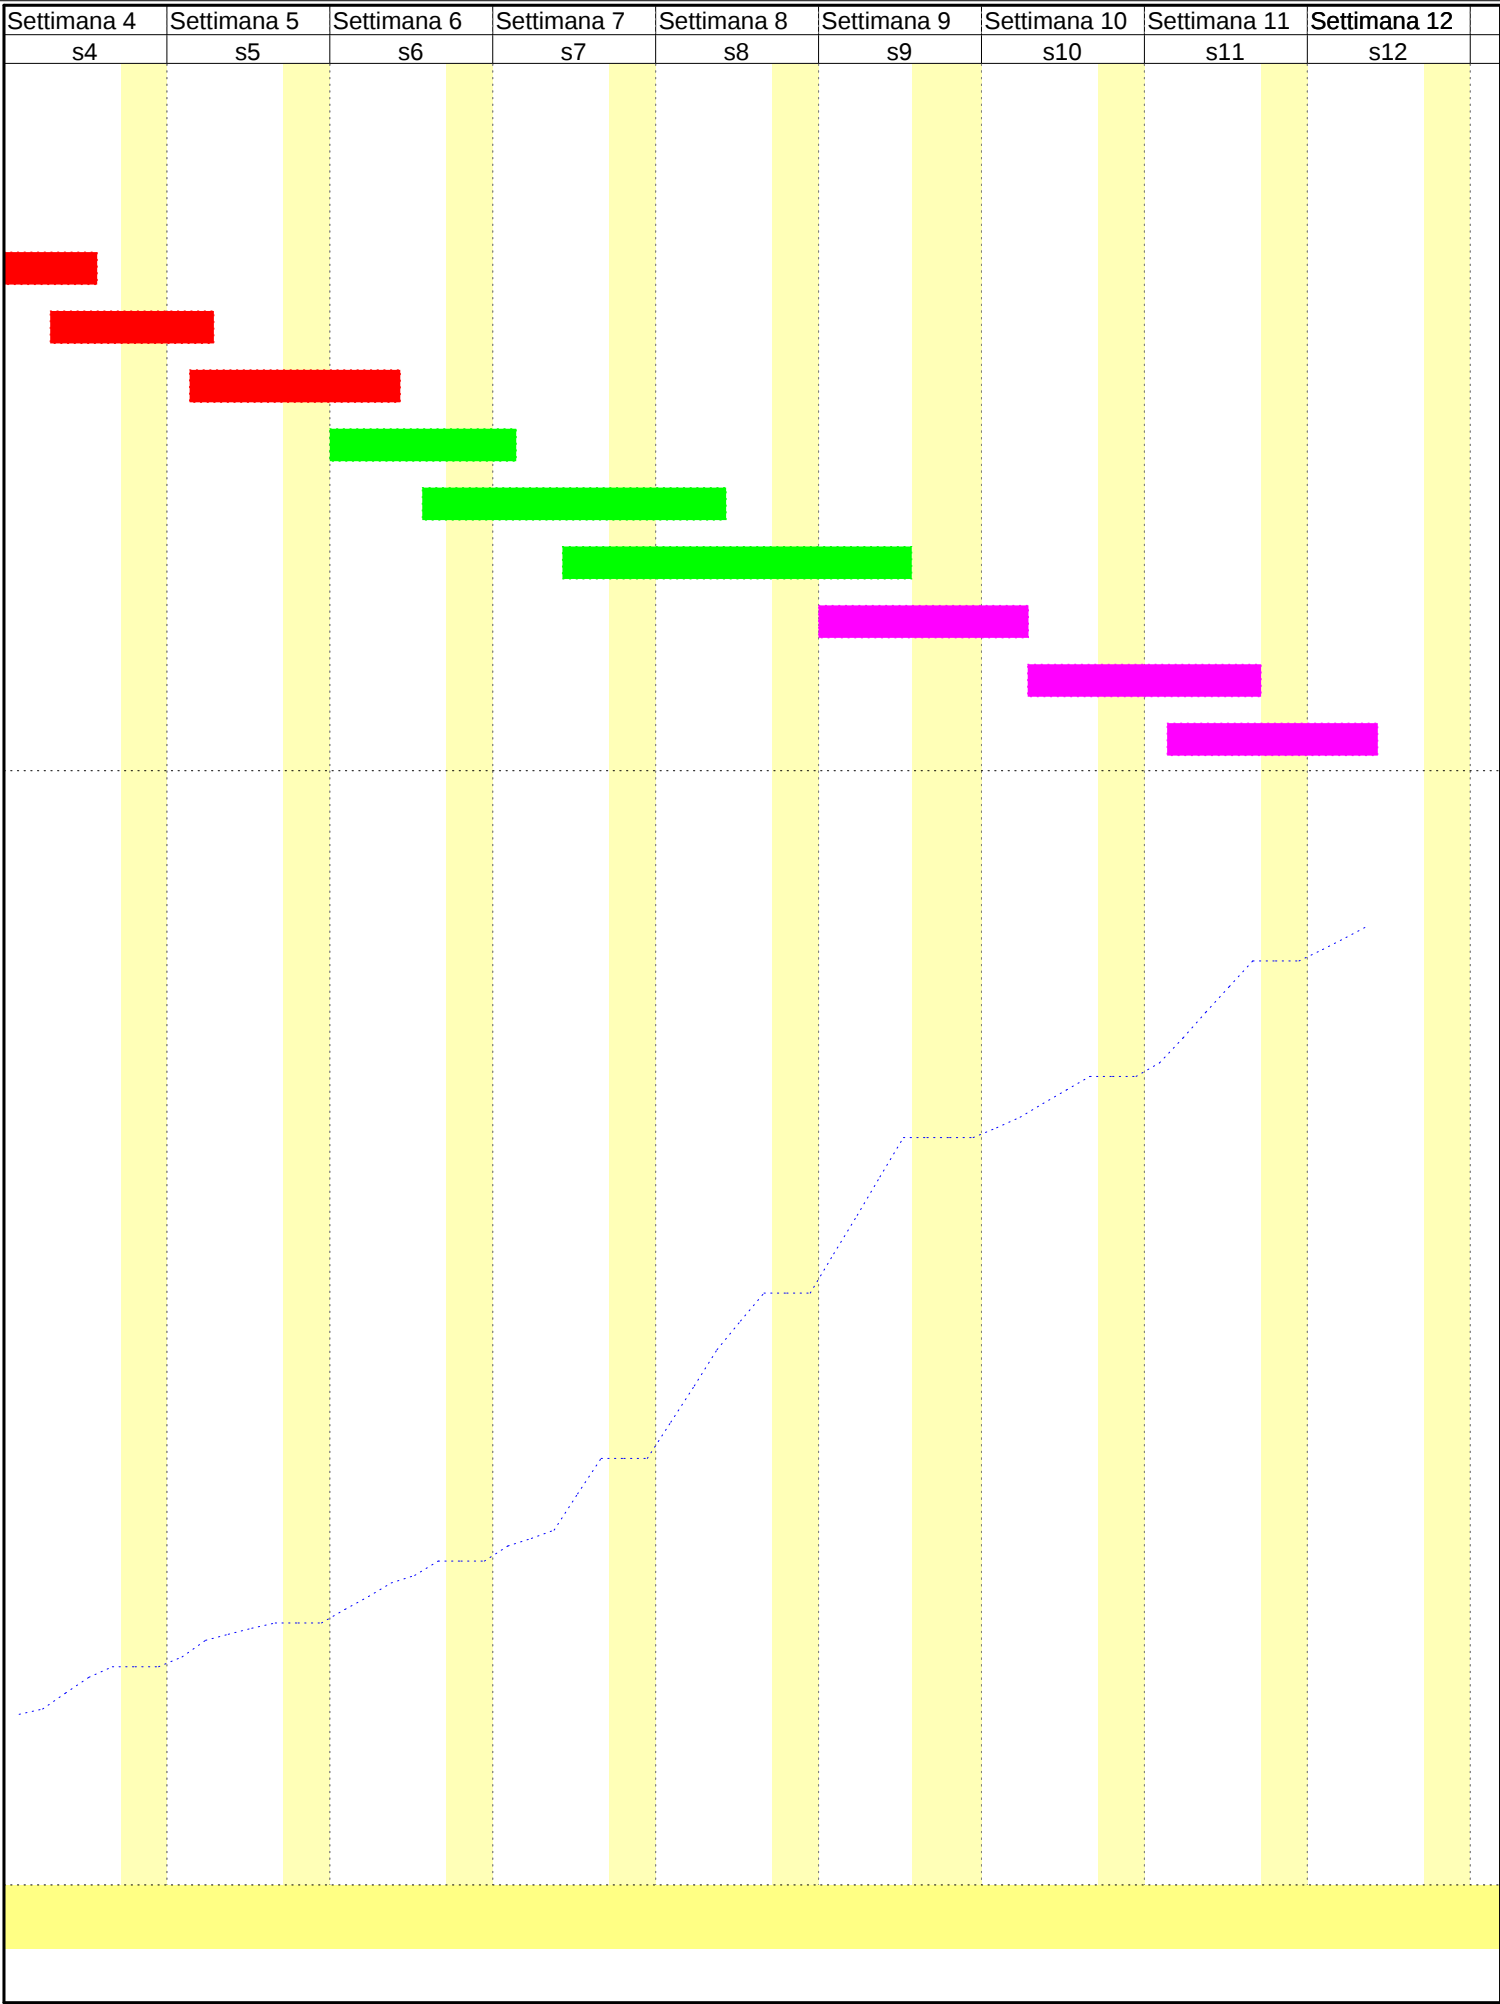

COMUNE di POMARANCE

Provincia di Pisa

Tabella Attività

OGGETTO: Interventi di rifacimento tratto di acquedotto in località "Gallerone" a Pomarance

COMMITTENTE: Comune di Pomarance

Pomarance, 18/07/2019

Il Tecnico
(Geom. Edoardo Bassanello)

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Tratto 1 - 2 : fresatura + scavi + trasporto a discarica	3'797,24	4,126	1 gg	9 gg	7	9
Tratto 1 - 2 : posa in opera tubazioni (compreso rinfiando e rinterro del restante scavo)	6'021,29	6,542	8 gg	12 gg	5	5
Tratto 1 - 2 : realizzazione camerette ed allacci	5'000,00	5,433	11 gg	18 gg	6	8
Tratto 2 - 3 : fresatura + scavi + trasporto a discarica	3'115,68	3,385	18 gg	25 gg	6	8
Tratto 2 - 3 : posa in opera tubazioni (compreso rinfiando e rinterro scavo)	4'940,54	5,368	24 gg	30 gg	5	7
Tratto 2 - 3 : realizzazione camerette ed allacci	4'000,00	4,346	30 gg	38 gg	7	9
Tratto 3 - 4 : fresatura + scavi + trasporto a discarica	4'186,70	4,549	36 gg	43 gg	6	8
Tratto 3 - 4 : posa in opera tubazioni (compreso rinfiando e rinterro scavo)	6'638,86	7,214	40 gg	52 gg	9	13
Tratto 3 - 4 : realizzazione camerette ed allacci	30'000,00	32,597	46 gg	60 gg	11	15
Tratto 4 - 5 : fresatura + scavi + trasporto a discarica	5'952,45	6,468	57 gg	65 gg	6	9
Tratto 4 - 5 : posa in opera tubazioni (compreso rinfiando e rinterro scavo)	10'380,94	11,279	66 gg	75 gg	8	10
Tratto 4 - 5 : realizzazione camerette ed allacci	8'000,00	8,692	72 gg	80 gg	7	9
Pomarance, 18/07/2019 il Tecnico Geom. Edoardo Bassanello						

COMUNE di POMARANCE

Provincia di Pisa

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Interventi di rifacimento tratto di acquedotto in località "Gallerone" a Pomarance

COMMITTENTE: Comune di Pomarance

Pomarance, 18/07/2019

Il Tecnico
(Geom. Edoardo Bassanello)

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
1 gg	542,46	542,46	0,589
2 gg	542,46	1'084,93	1,179
3 gg	542,46	1'627,39	1,768
4 gg	542,46	2'169,85	2,358
5 gg	542,46	2'712,31	2,947
8 gg	1'746,72	4'459,04	4,845
9 gg	1'746,72	6'205,75	6,743
10 gg	1'204,26	7'410,01	8,051
11 gg	2'037,59	9'447,60	10,265
12 gg	2'037,59	11'485,20	12,479
15 gg	833,33	12'318,53	13,385
16 gg	833,33	13'151,86	14,290
17 gg	833,33	13'985,20	15,196
18 gg	1'352,61	15'337,81	16,665
19 gg	519,28	15'857,09	17,230
22 gg	519,28	16'376,37	17,794
23 gg	519,28	16'895,65	18,358
24 gg	1'507,39	18'403,03	19,996
25 gg	1'507,39	19'910,42	21,634
26 gg	988,11	20'898,53	22,707
29 gg	988,11	21'886,64	23,781
30 gg	1'559,54	23'446,18	25,476
31 gg	571,43	24'017,60	26,097
32 gg	571,43	24'589,03	26,717
33 gg	571,43	25'160,46	27,338
36 gg	1'269,21	26'429,67	28,717
37 gg	1'269,21	27'698,89	30,096
38 gg	1'269,21	28'968,10	31,476
39 gg	697,78	29'665,88	32,234
40 gg	1'435,43	31'101,32	33,793
43 gg	1'435,43	32'536,75	35,353
44 gg	737,65	33'274,40	36,155
45 gg	737,65	34'012,05	36,956
46 gg	3'464,92	37'476,97	40,721
47 gg	3'464,92	40'941,90	44,486
50 gg	3'464,92	44'406,82	48,251
51 gg	3'464,92	47'871,75	52,015
52 gg	3'464,92	51'336,67	55,780
53 gg	2'727,27	54'063,94	58,744
54 gg	2'727,27	56'791,21	61,707
57 gg	3'719,35	60'510,56	65,748
58 gg	3'719,35	64'229,91	69,790
59 gg	3'719,35	67'949,26	73,831
60 gg	3'719,35	71'668,60	77,872
64 gg	992,08	72'660,68	78,950
65 gg	992,08	73'652,76	80,028
66 gg	1'297,62	74'950,37	81,438
67 gg	1'297,62	76'247,99	82,848
68 gg	1'297,62	77'545,61	84,258
71 gg	1'297,62	78'843,23	85,668
72 gg	2'440,47	81'283,70	88,319
73 gg	2'440,47	83'724,18	90,971
74 gg	2'440,47	86'164,65	93,623
75 gg	2'440,48	88'605,13	96,275
78 gg	1'142,86	89'747,99	97,516
79 gg	1'142,86	90'890,84	98,758
80 gg	1'142,86	92'033,70	100,000
Pomarance, 18/07/2019			
il Tecnico Geom. Edoardo Bassanello			
